

Prüfprotokoll der Druckprüfung mit Luft

Öko-Markert Rohr- und Kanalreinigung GmbH Hermann Löns Str. 13a 09114 Chemnitz Tel.: 0371 - 84219-0 · Fax: 0371 - 84219-26	Auftraggeber:	
	Auftragsort:	Greiz
	Auftragsart:	
Projektleiter:	Auftragsdatum: 09.08.2017	Prüfdatum: 09.08.2017
Geräteführer:	Auftragsnummer:	


Objekt

Objektart:	Haltung	Lage:	Laufende Nr.:	LP - 35	
Haltungsbez.:	C9	Nennw. [mm]:	290	Baujahr:	
Sch.-Anfang:	C9	Prüflänge [m]:	17,25	Material:	GFK
Sch.-Ende:	C10	Grundw. [m]:		Kanalart:	SW

Prüfdaten

Prüfung nach Vorschrift:	DIN EN 1610 LD		
Prüfdruck [mbar]:	200	Beruhigungsz. [min]:	00:05:00
Prüfzeit [min]:	00:02:00	Druckabfall [mbar]:	15

Druckverlauf

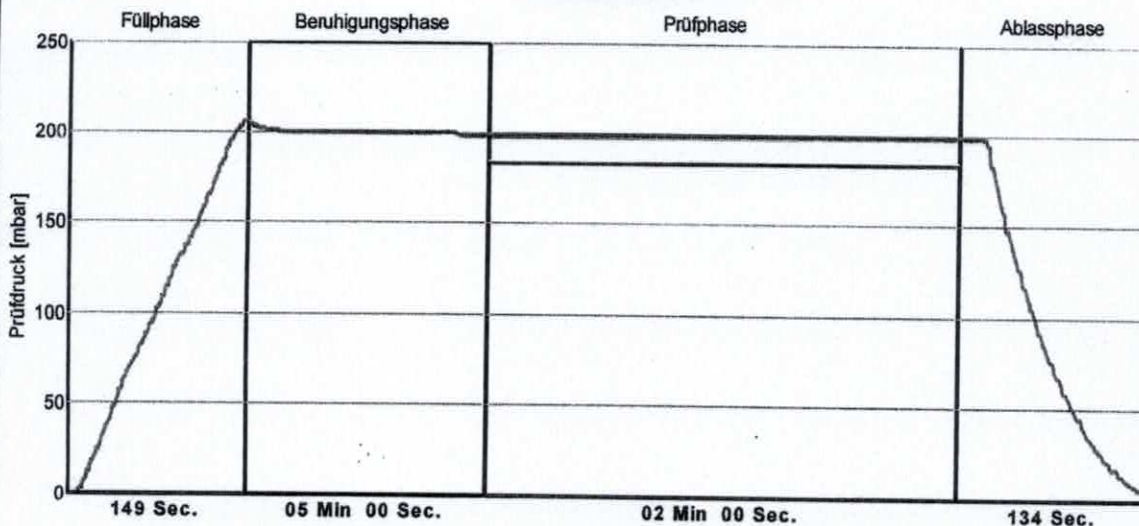

Prüfergebnis

Startwert [mbar]:	199,58	Endwert [mbar]:	199,62	Druckdiff. [mbar]:	-0,04	Prüfung bestanden
-------------------	--------	-----------------	--------	--------------------	-------	--------------------------

Besonderheiten / Bemerkungen

5 Prüfung

Unterschriften

Geräteführer	Bauleitung	Auftraggeber
--------------	------------	--------------
